

**「2024년 주민참여예산사업」**  
**2분기 관리카드**

2024. 7.



**서 대 문 구**  
**기 획 예 산 과**

## 2024년 주민참여예산사업 목록

(단위 : 천원)

연번	번호	사업명	추진부서	예산액	집행액	쪽	비고
1	2022-66	북이동 해담는마을 너른마당 조성사업(이월사업)	치수과	30,000	-	3	추진중
2	2024-01	(마을버스 10, 11번) 버스정류장 비가림막 설치	도로과	48,000	48,000	5	추진완료
3	2024-02	행정차량 내 안전운행을 위한 음주측정장치 설치	행정지원과	1,000	-	7	추진중
4	2024-03	인왕산 무궁화공원 진입로 목재흡막이 교체	푸른도시과	16,000	-	9	추진중
5	2024-04	명수어린이공원 인근 신호등 앞 그늘막 설치	재난안전과	3,000	-	11	추진중
6	2024-05	연가 어린이공원 내 울타리 보수	푸른도시과	20,000	-	13	추진중
7	2024-06	가재울초등학교 사거리 그늘막 설치	재난안전과	13,000	-	15	추진중
8	2024-07	홍은종합사회복지관 별관 내 유휴공간을 활용한 놀이/공유공간 운영	인생케어과	10,000	3,537	17	추진중
9	2024-08	가재울중앙근린공원 내 무료 와이파이 설치	스마트정보과	45,200	-	19	추진중
10	2024-09	거꾸로 어린이공원 개선공사	푸른도시과	100,000	-	21	추진중

## 2022-66. 북이동 해담는마을 너른마당 조성사업

### 사업개요

사업명	북이동 해담는마을 너른마당 조성사업		
위치	서대문구 불광천길 204	행정동	북가좌2동
기간	2022. 2. ~ 2024. 12.		
사업비	30,000천원		
개요	데크마당 조성		
추진부서	치수과		

### 집행 현황

○ 세부사업명(예산서상) : 지방하천 유지관리

편성액	집행액	집행률	비고 (미집행 사유 등)
30,000천원	0천원	0%	불광천 수변공간 조성공사 포함

### 분기별 추진 계획 및 실적(2024년)

분기	계 획	실 적
1/4	· 주민면담 및 사업방향 설명	· 주민면담 및 사업방향 설명
2/4	· 공사 시행	· 공사 시행
3/4	· 공사 준공	-
4/4	-	-

□ 현장 사진

시 행 전	시 행 후
	<p style="text-align: center;">“2024년 완료 예정”</p>

□ 주민제안자 면담기록

제 안 자	일 시	방 법	면담 내용
김**	2022. 2.	사업현장 동행	· 진행상황 안내 및 제안자 의견 청취
김**	2022. 11.	유선 통화	· 서울시 정비계획과 중복 지연 안내
김**	2022. 12.	유선 통화	· '23년 서울시 예산으로 시행 안내
김**	2024. 2.	유선 통화	· 공사시행 및 공사개요 안내

치수과	수변감성하천팀	담당자	330-6759
-----	---------	-----	----------

# 2024-01. 버스정류장 비가림막 설치(마을버스 10, 11번)

## □ 사업개요

사업명	버스정류장 비가림막 설치(마을버스 10, 11번)		
위치	홍은종합사회복지관 등 6개소	행정동	홍제동
기간	2024. 1. ~ 3.		
사업비	48,000천원		
개요	버스정류장 비가림막 설치		
추진부서	도로과		

## □ 집행 현황

○ 세부사업명(예산서상) : 대중교통편의시설 설치

편성액	집행액	집행률	비고 (미집행 사유 등)
48,000천원	48,000천원	100%	

## □ 분기별 추진 계획 및 실적

분기	계 획	실 적
1/4	· 계획수립 · 공사발주 및 준공	· 계획수립 · 설치완료
2/4	· ·	· ·
3/4	· ·	· ·
4/4	· ·	· ·

현장 사진 ※ 시행 전·후 사진 비교 가능하도록 촬영 (동일 위치, 각도 등)



주민제안자 면담기록

제안자	일시	방법	면담내용
박 0 0	2024. 4. 26.	유선전화	·설치완료 안내

※ 향후 관리카드를 홈페이지 등에 공개하므로, 개인정보(성명, 핸드폰 번호 등) 기재하지 않도록 주의

도로과	교통시설팀	담당자	330-1797
-----	-------	-----	----------

## 2024-02. 행정차량 내 안전운행을 위한 음주측정장치 설치

### 사업개요

사업명	행정차량 내 안전운행을 위한 음주측정장치 설치		
위치	서대문구 전체	행정동	서대문구 전체
기간	2024. 1. 1. ~ 12. 31.		
사업비	1,000천원		
개요	행정차량 내 안전운행을 위한 음주측정장치 설치		
추진부서	행정지원과		

### 집행 현황

○ 세부사업명(차량 유지관리) : 음주측정기 설치(주민참여예산)

편성액	집행액	집행률	비고 (미집행 사유 등)
1,000천원	-	-	계획 수립

### 분기별 추진 계획 및 실적

분기	계 획	실 적
1/4	· 관련 운영계획 수립	·
2/4	· 차량용 음주측정기 가격 조사 및 업체 조회	·
3/4	· 음주측정기 설치 및 비치	·
4/4	·	·

현장 사진 ※ 시행 전·후 사진 비교 가능하도록 촬영 (동일 위치, 각도 등)

시 행 전	시 행 후

주민제안자 면담기록

제 안 자	일 시	방 법	면담 내용

※ 향후 관리카드를 홈페이지 등에 공개하므로, 개인정보(성명, 핸드폰 번호 등) 기재하지 않도록 주의

행정지원과	총무팀	담당자	330-1311
-------	-----	-----	----------

## 2024-03. 인왕산 무궁화공원 진입로 목재흡막이 교체

### □ 사업개요

사업명	인왕산 무궁화공원 진입로 목재흡막이 교체		
위치	홍제동 산1-52일원	행정동	홍제2동
기간	2024. 4. ~ 9.		
사업비	금16,000천원		
개요	노후 목재흡막이 철거 및 신규 설치		
추진부서	푸른도시과		

### □ 집행 현황

○ 세부사업명(예산서상) : 등산로 및 약수터 주변 환경개선

편성액	집행액	집행률	비고 (미집행 사유 등)
16,000천원	-천원	%	계획 수립 중

### □ 분기별 추진 계획 및 실적

분기	계획	실적
1/4	· 계획 수립	· 현장답사 및 설계방안 검토
2/4	· 계획 수립	· 설계 중
3/4	· 공사 시행 및 준공	·
4/4	-	-

**현장 사진** ※ 시행 전·후 사진 비교 가능하도록 촬영 (동일 위치, 각도 등)

시행 전	시행 후
	

**주민제안자 면담기록**

제안자	일시	방법	면담내용
오OO	2024. 4.	유선전화	· 교체 방법 관련 검토

※ 향후 관리카드를 홈페이지 등에 공개하므로, 개인정보(성명, 핸드폰 번호 등) 기재하지 않도록 주의

푸른도시과	자연생태팀	담당자	330-1961
-------	-------	-----	----------

## 2024-04. 명수어린이공원 인근 신호등 앞 그늘막 설치

### □ 사업개요

사업명	명수어린이공원 인근 신호등 앞 그늘막 설치		
위치	명수 어린이 공원(북아현동 210-24) 맞은편	행정동	총현동
기간	2024. 4. 1. ~ 6. 30.		
사업비	3,000 천원		
개요	폭염기간 온열질환 예방을 위한 그늘막 설치 및 운영		
추진부서	재난안전과		

### □ 집행 현황

○ 세부사업명(예산서상) : 폭염 및 한파 종합대책 추진

편성액	집행액	집행률	비고 (미집행 사유 등)
3,000천원	0천원	0%	3분기 집행 예정

### □ 분기별 추진 계획 및 실적

분기	계획	실적
1/4	-	-
2/4	· 설치 위치 확인(주민제안자 확인) · 그늘막 구매 및 설치 계약 진행 · 설치 및 폭염기간 중 운영	추진 중
3/4	· 설치 및 폭염기간 중 운영	-
4/4	-	-

**현장 사진** ※ 시행 전·후 사진 비교 가능하도록 촬영 (동일 위치, 각도 등)

시행 전	시행 후
1분기 미추진 2분기 추진 완료 예정	2분기 미추진 3분기 추진 완료

**주민제안자 면담기록**

제안자	일시	방법	면담 내용
권OO	-	-	2분기 추진 시 설치 위치 재확인 예정

※ 향후 관리카드를 홈페이지 등에 공개하므로, 개인정보(성명, 핸드폰 번호 등) 기재하지 않도록 주의

<b>재난안전과</b>	<b>재난관리팀</b>	<b>담당자</b>	<b>330-1418</b>
--------------	--------------	------------	-----------------

## 2024-05. 연가 어린이공원 내 울타리 보수

### 사업개요

사업명	연가 어린이공원 내 울타리 보수		
위치	연가어린이공원	행정동	남가좌2동
기간	2024. 1. ~ 6.		
사업비	20,000천원		
개요	울타리 교체		
추진부서	푸른도시과		

### 집행 현황

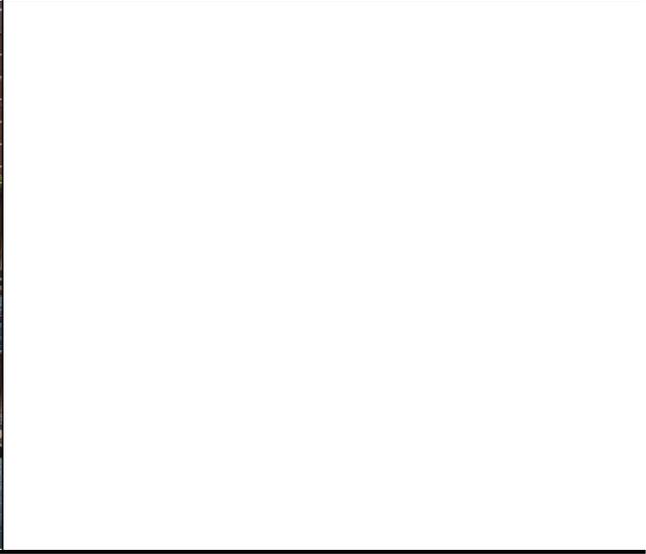
○ 세부사업명(예산서상) : 노후 어린이놀이시설 교체

편성액	집행액	집행률	비고 (미집행 사유 등)
20,000천원	천원	%	

### 분기별 추진 계획 및 실적

분기	계 획	실 적
1/4	· 추진계획 수립 · 실시설계용역 시행	· 추진계획 수립 · 실시설계용역 시행
2/4	· 공사 시행	· 공사 시행
3/4		
4/4		

**현장 사진** ※ 시행 전·후 사진 비교 가능하도록 촬영 (동일 위치, 각도 등)

시행 전	시행 후
	

**주민제안자 면담기록**

제안자	일시	방법	면담내용
서 0 0	2024. 3. 18.	유선전화	· 2분기 공사예정 알림

※ 향후 관리카드를 홈페이지 등에 공개하므로, 개인정보(성명, 핸드폰 번호 등) 기재하지 않도록 주의

푸른도시과	공원관리팀	담당자	330-1714
-------	-------	-----	----------

## 2024-06. 가재울초등학교 사거리 그늘막 설치

### □ 사업개요

사업명	가재울초등학교 사거리 그늘막 설치		
위치	가재울사거리(남가좌동 384) 교통섬	행정동	남가좌1동
기간	2024. 4. 1. ~ 6. 30.		
사업비	13,000 천원		
개요	폭염기간 온열질환 예방을 위한 그늘막 설치 및 운영		
추진부서	재난안전과		

### □ 집행 현황

○ 세부사업명(예산서상) : 폭염 및 한파 종합대책 추진

편성액	집행액	집행률	비고 (미집행 사유 등)
13,000천원	0천원	0%	3분기 집행 예정

### □ 분기별 추진 계획 및 실적

분기	계획	실적
1/4	-	-
2/4	· 설치 위치 확인(주민제안자에 확인) · 그늘막 구매 및 설치 계약 진행	· 5월 그늘막 종류 변경을 위해 제안자와 통화
3/4	· 설치 및 폭염기간 중 운영	-
4/4	-	-

**현장 사진** ※ 시행 전·후 사진 비교 가능하도록 촬영 (동일 위치, 각도 등)

시행 전	시행 후
-	2분기 미추진 3분기 추진 완료예정

**주민제안자 면담기록**

제안자	일시	방법	면담 내용
박OO	2024.5.	전화통화	보행자 불편을 고려하여 그늘막 종류를 스마트에서 일반으로 변경

※ 향후 관리카드를 홈페이지 등에 공개하므로, 개인정보(성명, 핸드폰 번호 등) 기재하지 않도록 주의

<b>재난안전과</b>	<b>재난관리팀</b>	<b>담당자</b>	<b>330-1418</b>
--------------	--------------	------------	-----------------

# 2024-07. 흥은종합사회복지관 별관 내 유희공간을 활용한 놀이/공유공간 운영

## □ 사업개요

사업명	서대문구 가족 모두를 위한 공유 공간 '키즈 스테이션' 운영		
위치	서울특별시 서대문구 세검정로 71	행정동	서대문구 홍제동
기간	2024. 3. 1. ~ 11. 30.		
사업비	10,000천원		
개요	모두의 공간(가족공간, 공간대관, 일시 보육 서비스) 운영 모두의 배움(양육자, 아동 교육/가족 테마 활동) 진행		
추진부서	마을소통2팀		

## □ 집행 현황

○ 세부사업명 : 흥은종합사회복지관 별관 내 유희공간을 활용한 놀이/공유공간 운영

편성액	집행액	집행률	비고 (미집행 사유 등)
10,000천원	3,537천원	35.37%	

## □ 분기별 추진 계획 및 실적

분기	계 획	실 적
1/4	<ul style="list-style-type: none"> <li>공간 구성 및 홍보</li> <li>이용자 접수</li> <li>가족 공간</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>가족 공간 구성 물품 구입(3건)</li> <li>키즈 스테이션 홍보 물품 구입(1건)</li> <li>키즈 스테이션 SNS 홍보(3건)</li> </ul>
2/4	<ul style="list-style-type: none"> <li>24.4.~키즈스테이션 가족공간 개방</li> <li>24.6.~공간대관 및 일시보육 서비스 진행</li> <li>모두의 배움(양육자, 아동, 가족 테마활동) 진행</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>총 163명 이용자 등록</li> <li>공간대관 9건 32명 이용</li> <li>모두의 배움                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 양육자 교육(부모양육태도검사) : 1건 10명 진행</li> <li>- 가족 테마활동(도어벨 만들기) : 1건 10명 진행</li> </ul> </li> </ul>

□ 현장 사진



□ 주민제안자 면담기록

제 안 자	일 시	방 법	면담 내용
정00	2024. 3. 7.	사업현장 동행	· 사업현장 확인 및 공간 변화에 대한 향후 계획 및 일정 논의
	2024. 3. 27.	사무실 대면	· 공간 구성 1차 확인 · 공간 홍보에 대한 논의
	2024. 5. 8.	사업현장 방문	· 키즈 스테이션 가족공간 구성 및 변화 확인
	2024. 6. 3.	사업현장 방문	· 키즈 스테이션 공간대관 서비스 이용자 및 대여 현장 확인

인생케어과	인생케어정책팀	담당자	330-1264
-------	---------	-----	----------

# 2024-08. 가재울 중앙근린공원 내 무료 와이파이 설치

## □ 사업개요

사업명	가재울 중앙근린공원 공공와이파이 설치		
위치	거북골로 145	행정동	북가좌1동
기간	2024. 1. ~ 10.		
사업비	45,200천원		
개요			
추진부서	스마트정보과		

## □ 집행 현황

○ 세부사업명(예산서상) : 가재울 중앙공원 공공와이파이 설치

편성액	집행액	집행률	비고 (미집행 사유 등)
45,200천원	0천원	0%	현장실사 및 계획 수립추진

## □ 분기별 추진 계획 및 실적

분기	계 획	실 적
1/4	· 현장 실사 및 기초설계	· 현장 실사 추진
2/4	· 현장 실사 및 기초설계 실시 · 계획 수립 및 발주	· 푸른도시과 협의(공원 굴착 등 푸른 도시과 cctv 기능 고도화 사업 연계 추진)
3/4	· 사업 시행	
4/4	· 준공	

**현장 사진** ※ 시행 전·후 사진 비교 가능하도록 촬영 (동일 위치, 각도 등)

시행 전	시행 후

**주민제안자 면담기록**

제안자	일시	방법	면담 내용
이 0 0	2023. 7. 13.	유선전화	· 제안자 의견 청취

※ 향후 관리카드를 홈페이지 등에 공개하므로, 개인정보(성명, 핸드폰 번호 등) 기재하지 않도록 주의

스마트정보과	정보통신보안팀	담당자	330-8693
--------	---------	-----	----------

## 2024-09. 거꾸로 어린이공원 개선공사

### □ 사업개요

사업명	거꾸로 어린이공원 개선공사		
위치	거꾸로어린이공원	행정동	북가좌2동
기간	2024. 1. ~ 6.		
사업비	100,000천원		
개요	노후 시설물 교체		
추진부서	푸른도시과		

### □ 집행 현황

○ 세부사업명(예산서상) : 노후 어린이놀이시설 교체

편성액	집행액	집행률	비고 (미집행 사유 등)
100,000천원	천원	%	

### □ 분기별 추진 계획 및 실적

분기	계 획	실 적
1/4	· 추진계획 수립 · 실시설계용역 시행	· 추진계획 수립 · 실시설계용역 시행
2/4	· 공사 시행	· 공사 시행
3/4		
4/4		

**현장 사진** ※ 시행 전·후 사진 비교 가능하도록 촬영 (동일 위치, 각도 등)

시행 전	시행 후
	

**주민제안자 면담기록**

제안자	일시	방법	면담내용
정 0 0	2024. 3. 18.	유선전화	· 2분기 공사예정 알림

※ 향후 관리카드를 홈페이지 등에 공개하므로, 개인정보(성명, 핸드폰 번호 등) 기재하지 않도록 주의

푸른도시과	공원관리팀	담당자	330-1714
-------	-------	-----	----------
